Bürgerveranstaltung

des Arbeitskreises Herbeder Brücken

Haus Herbede 09.10.2024

vorgetragen von Dr. Arne Meinshausen

ARBEITSKREIS HERBEDER BRÜCKENNEUBAU

Dieter Boele, Gerd Frahne, Dominik Grütter, Irina Heckmann,
Benno Jacobi, Harald Kahl, Philipp Kawalek, Michael Loeken,
Dr. Arne Meinshausen, Jörg Rumberg, Dr. Gabriele Voss

Keine Vollsperrung

Brückenabzweig

statt jahrelanges Verkehrschaos!

ARBEITSKREIS HERBEDER BRÜCKENNEUBAU

Abriss der Omegabrücke

nicht

vor Fertigstellung des Brückenabzweigs

ARBEITSKREIS HERBEDER BRÜCKENNEUBAU

Herbede

Ein Stadtteil wird neu angeschlossen

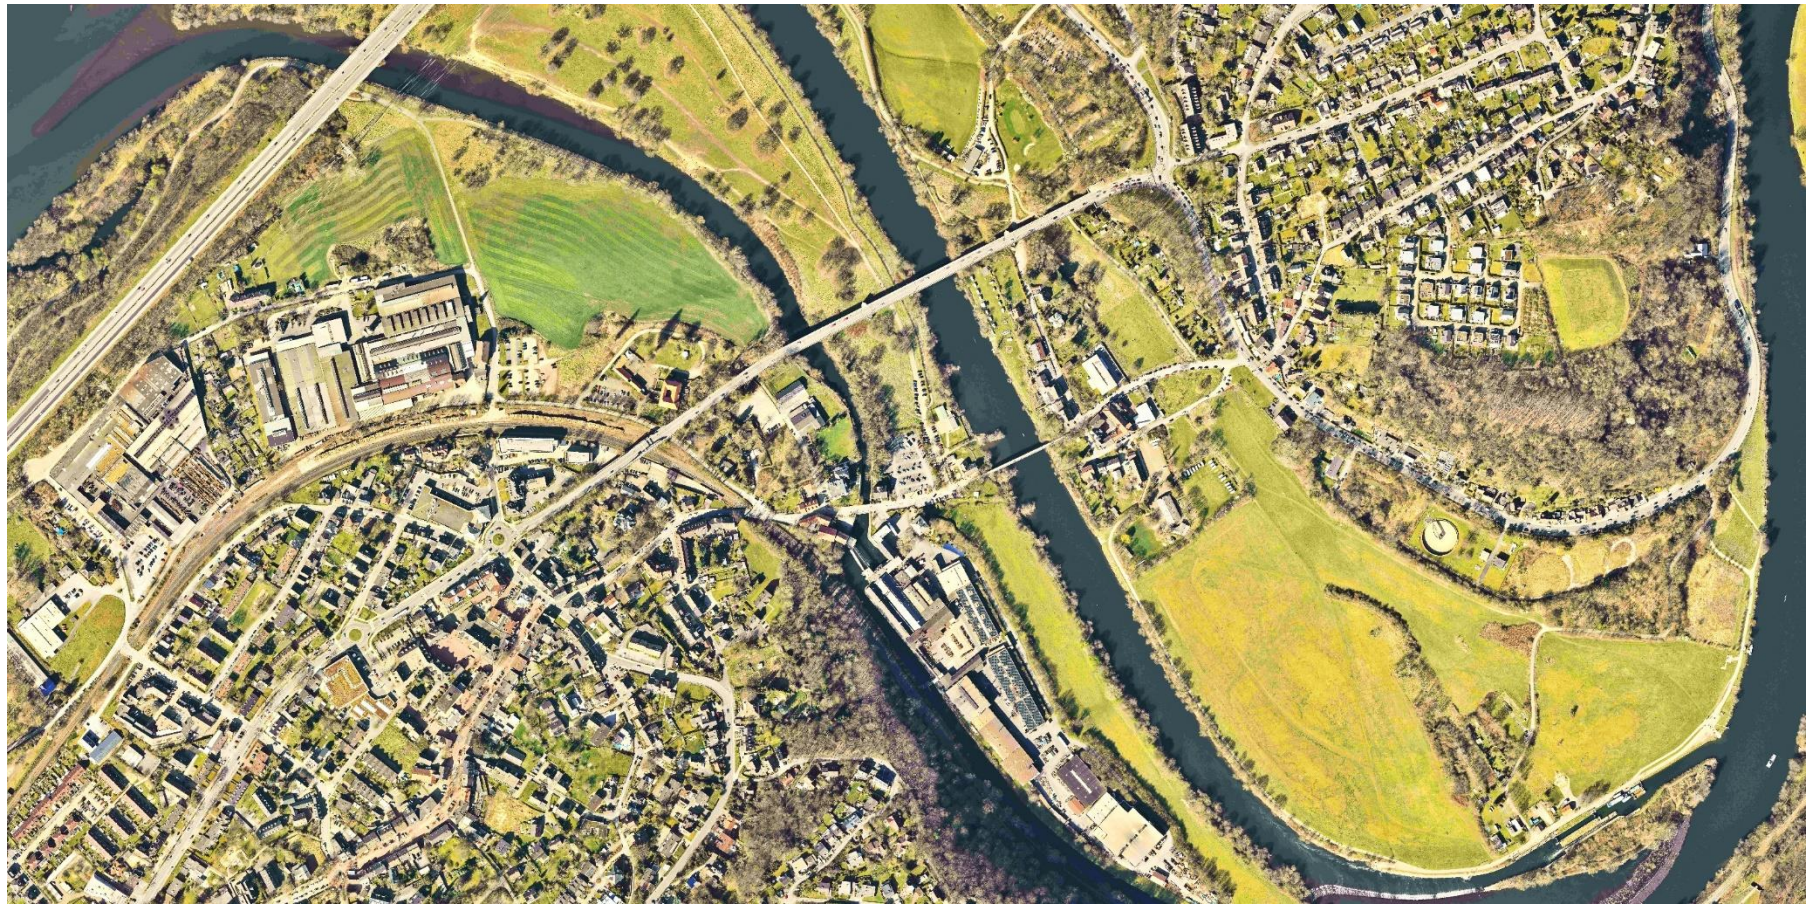

Herbeder Verkehrswege-Neubau

10 Jahre erhebliche Einschränkungen

Neubau Wittener-Straße

mindestens **3 Jahre**

Neubau der Ruhrbrücken, Omegabrücke, Lakebrücke

mindestens **7 Jahre**

Herbeder Verkehrswege-Neubau

Erfahrungen aus der Vergangenheit

Neubau Wittener-Straße (Straßen-NRW)

geplant **1 Jahr** Bauzeit

tatsächlich mindestens **3 Jahre**

Neubau der Pferdebachstraße (Stadt Witten)

geplant **2 Jahre** Bauzeit

tatsächlich **5 Jahre**

Vollsperrung der Omegabrücke

(Straßen-NRW)

8 – 12 Monate

Tatsächlich eher mind. **2 Jahre**

Umfangreiche Baumaßnahmen:

Abriss Rampe, Omegabrücke, alter Verbindungstrakt zu den Flussbrücken

Neubau 3 Beton-Spundwände in beengter Bauweise, Fertigbrücke (?), Anschlusstrakt zu neuen Flussbrücken

Vollsperrung der Ruhrbrückenquerung

Es geht auch

ohne Vollsperrung (!)

ARBEITSKREIS HERBEDER BRÜCKENNEUBAU

Brückenabzweig

in Höhe Haus Herbede

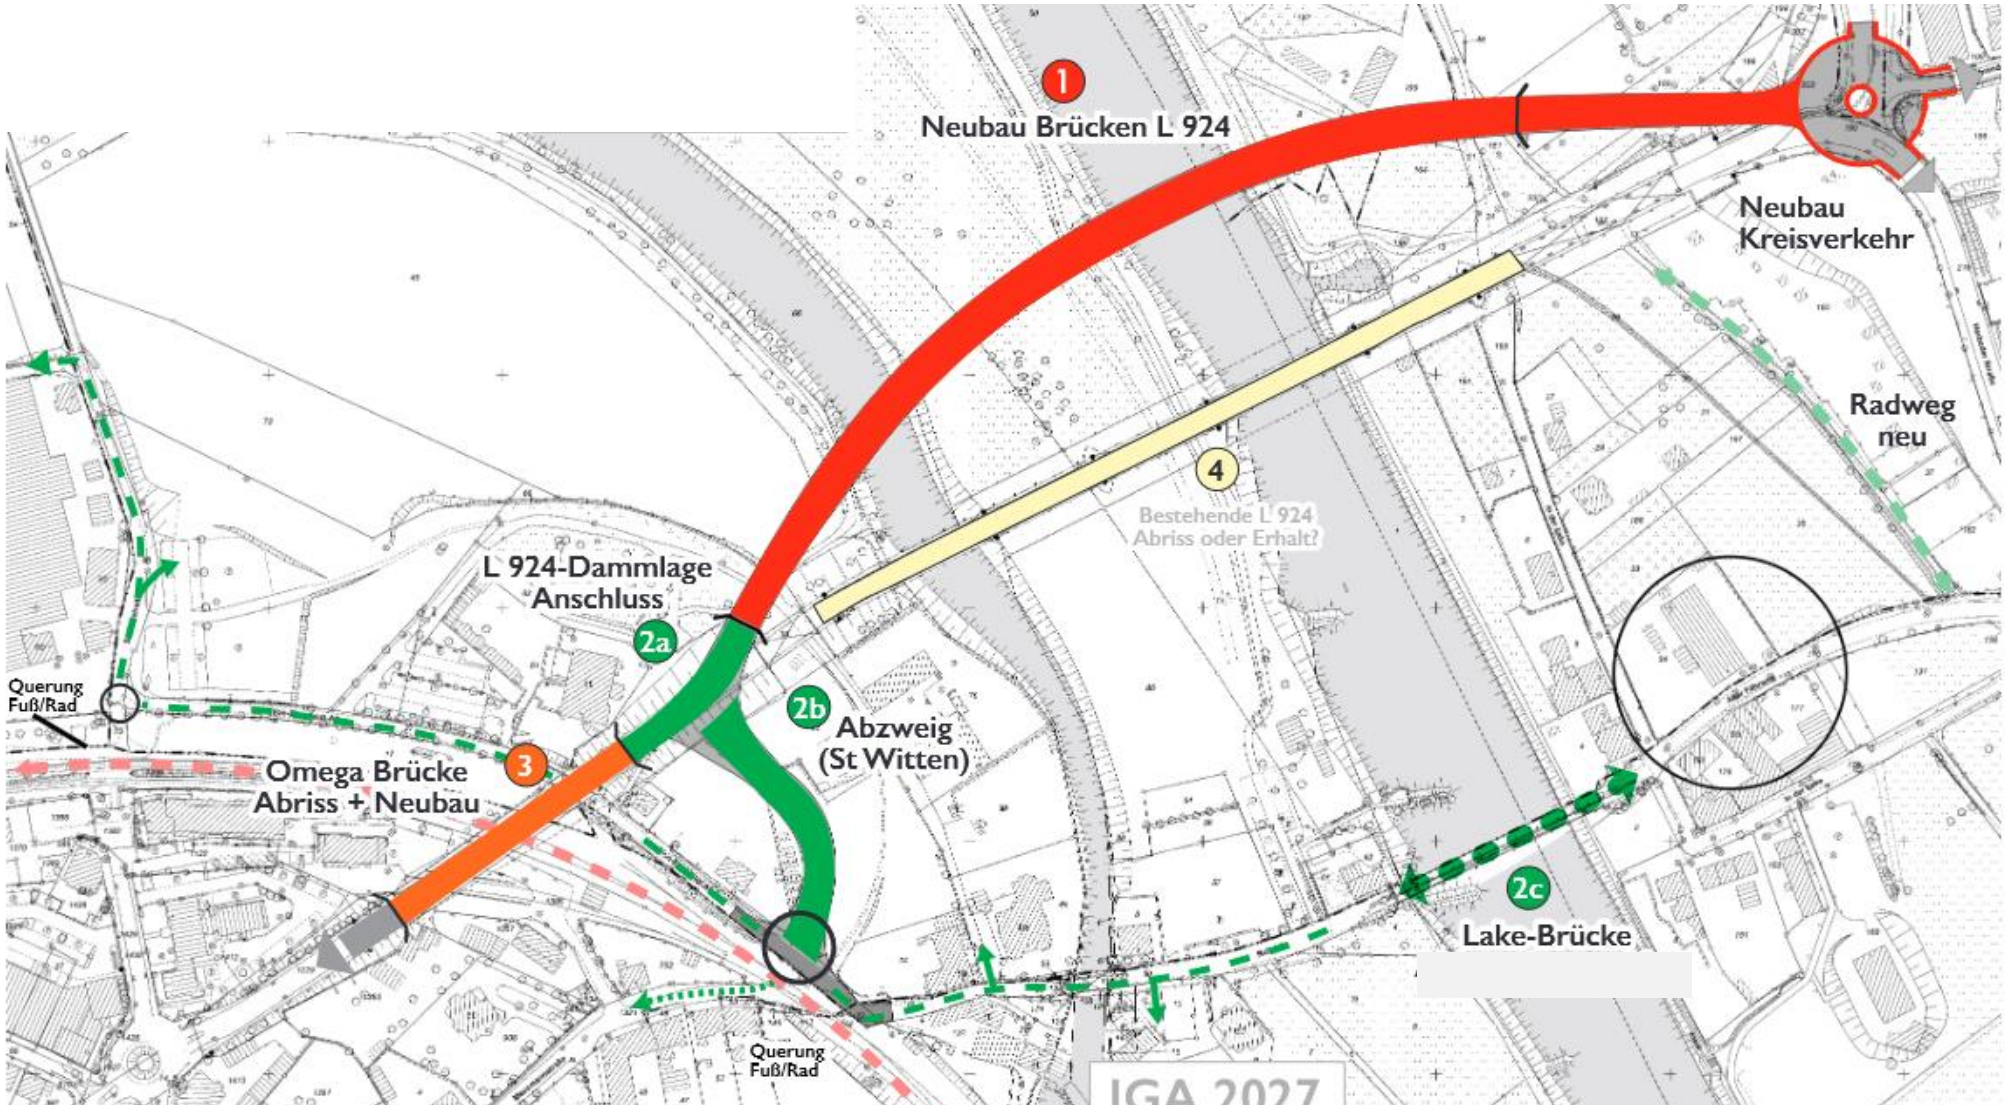

Keine Vollsperrung der Ruhrbrückenquerung

- Möglichst zügiger Neubau des **Brückenabzweigs**
- Sicherheits-**Stützungsmaßnahmen** der Omegabrücke
- **Anschluss** des Brückenabzweigs an die neuen Ruhrbrücken
- erst anschließend **Abriss der Omegabrücke**

ARBEITSKREIS HERBEDER BRÜCKENNEUBAU

Herbeder-Hevener Brückenneubau
Auswirkungen auf die Region

Herbeder und Wittener Bevölkerung

EDEKA
Wormholzer Str.

Herbeder-Hevener-Wittener Geschäfte und Betriebe

Herbeder-Hevener Brückenneubau

Auswirkungen auf die Region

Gesundheitsversorgung von Witten und Umgebung

RATHAUS

Neubau Flussbrücken und Kreisverkehr Heven

2025 – 2028 (?)

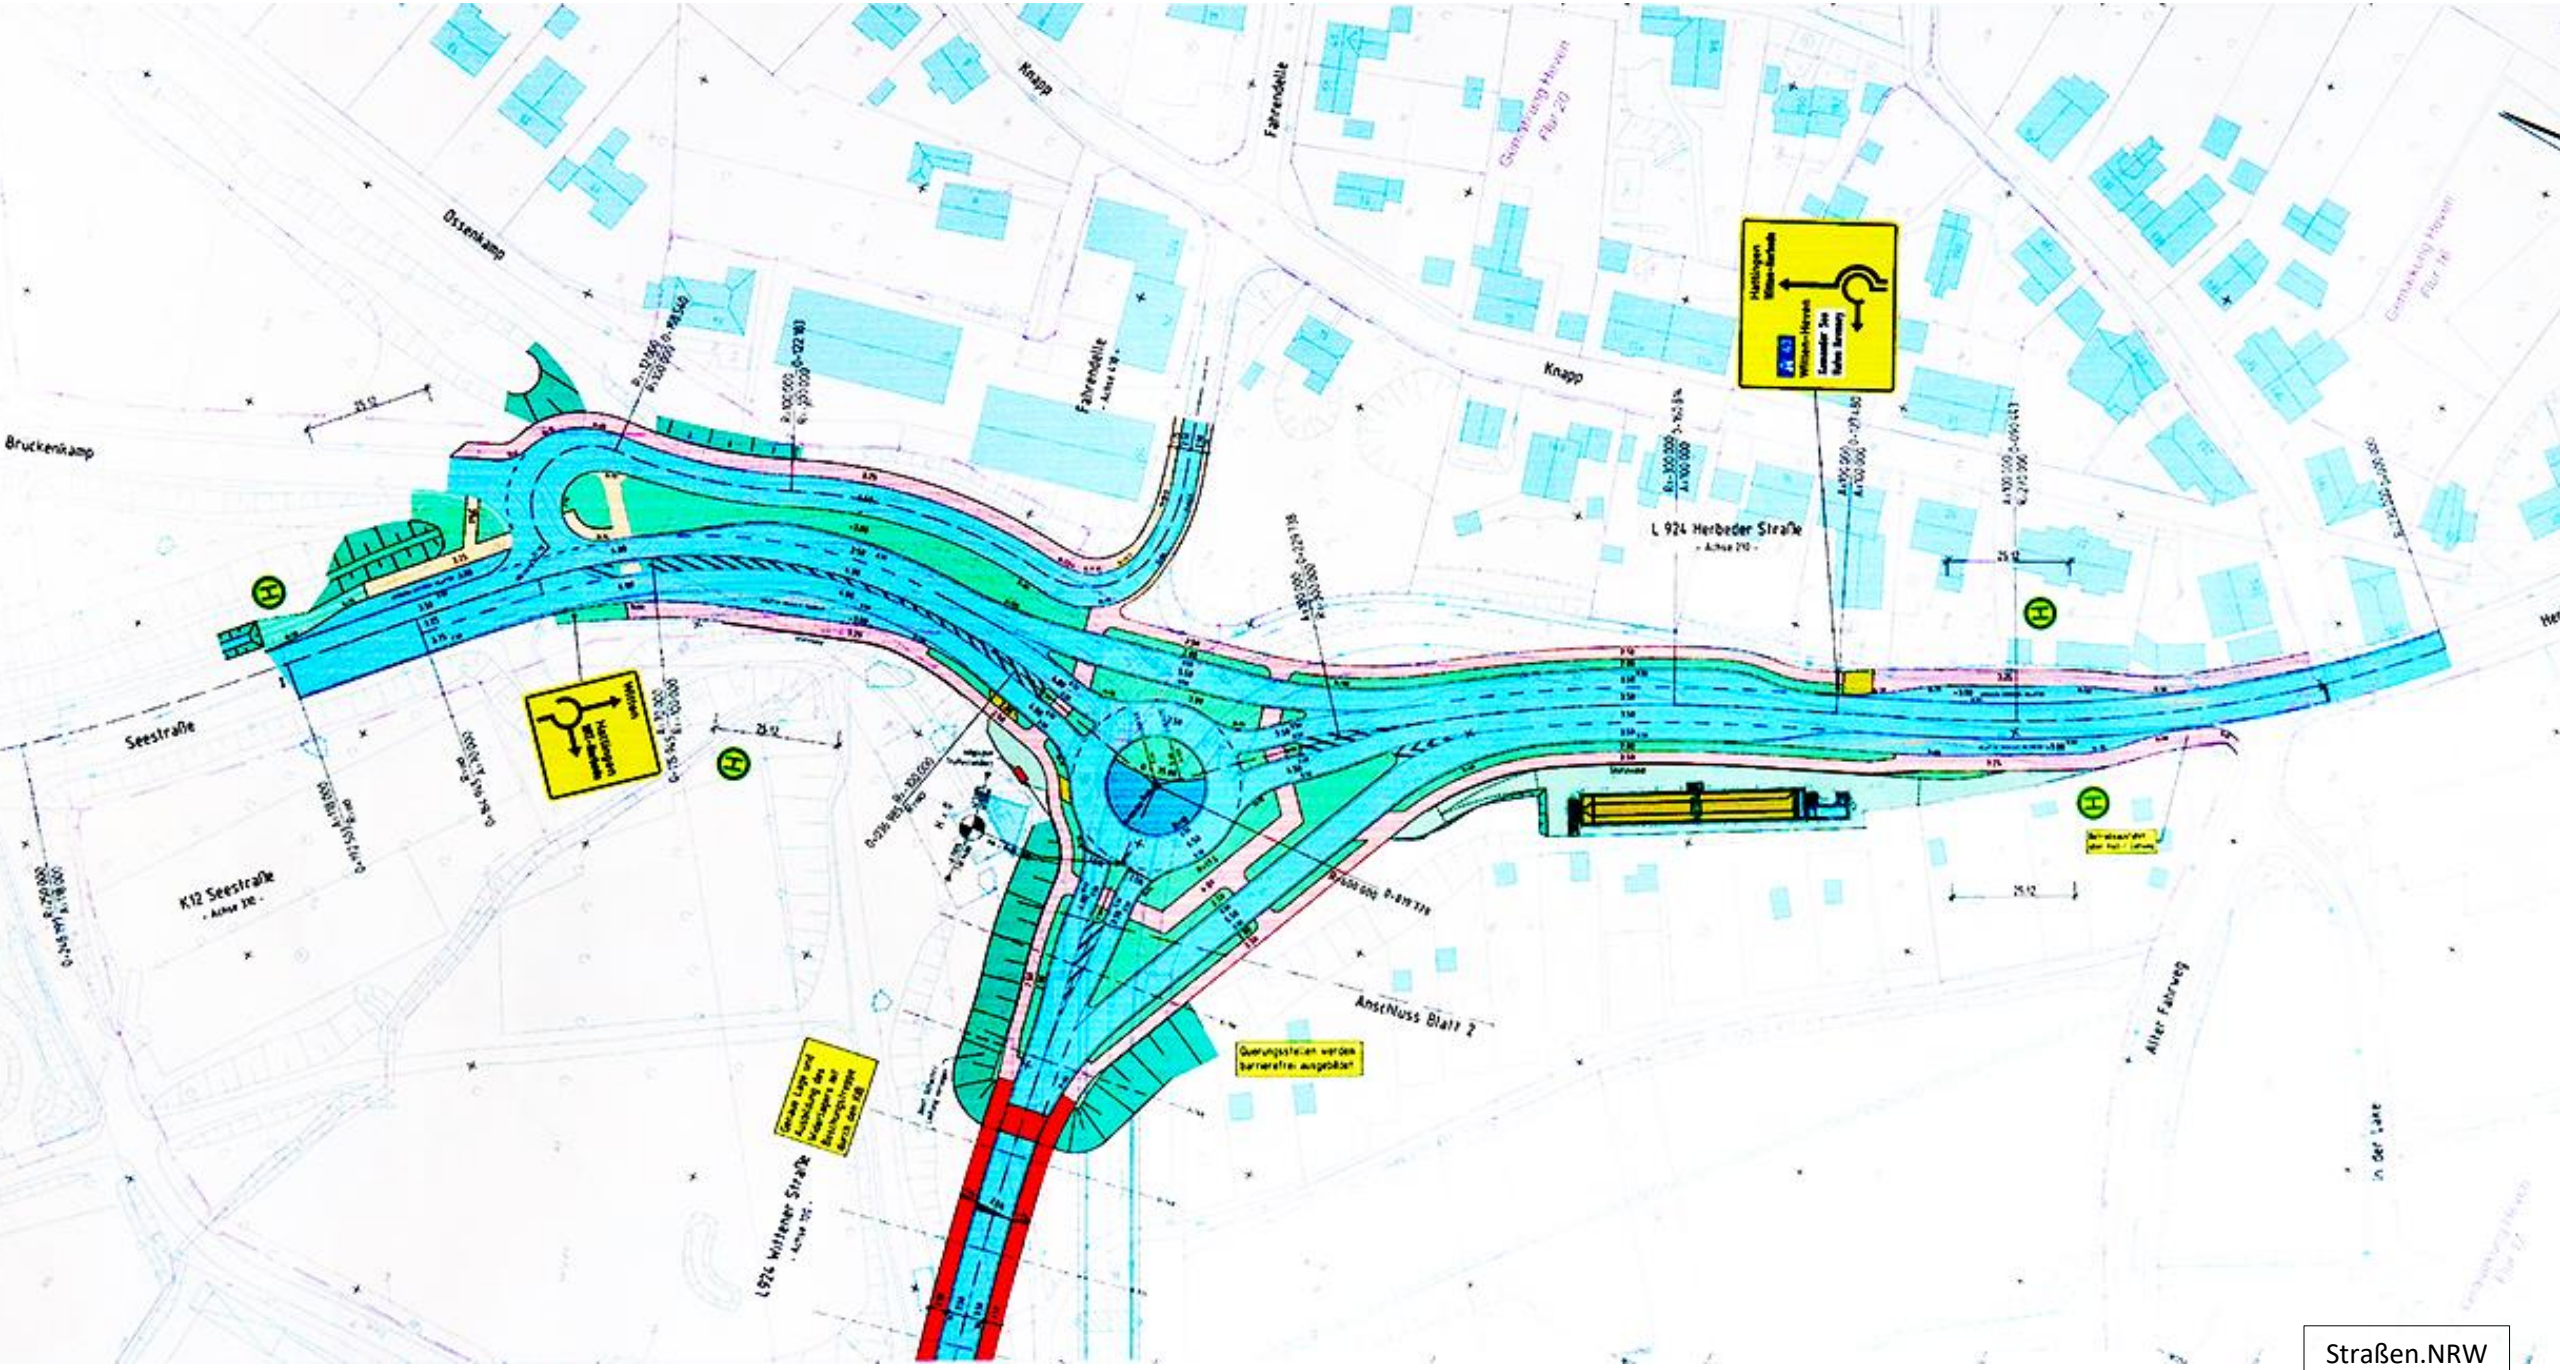
Knapp
Fahrendelle
Ossenkamp
Bruckenkamp
Seestraße
K12 Seestraße
L 924 Herbeder Straße
L 924 Wittener Straße
Anst Nuss Blatt 2
Aller Fahrweg
Straßen.NRW

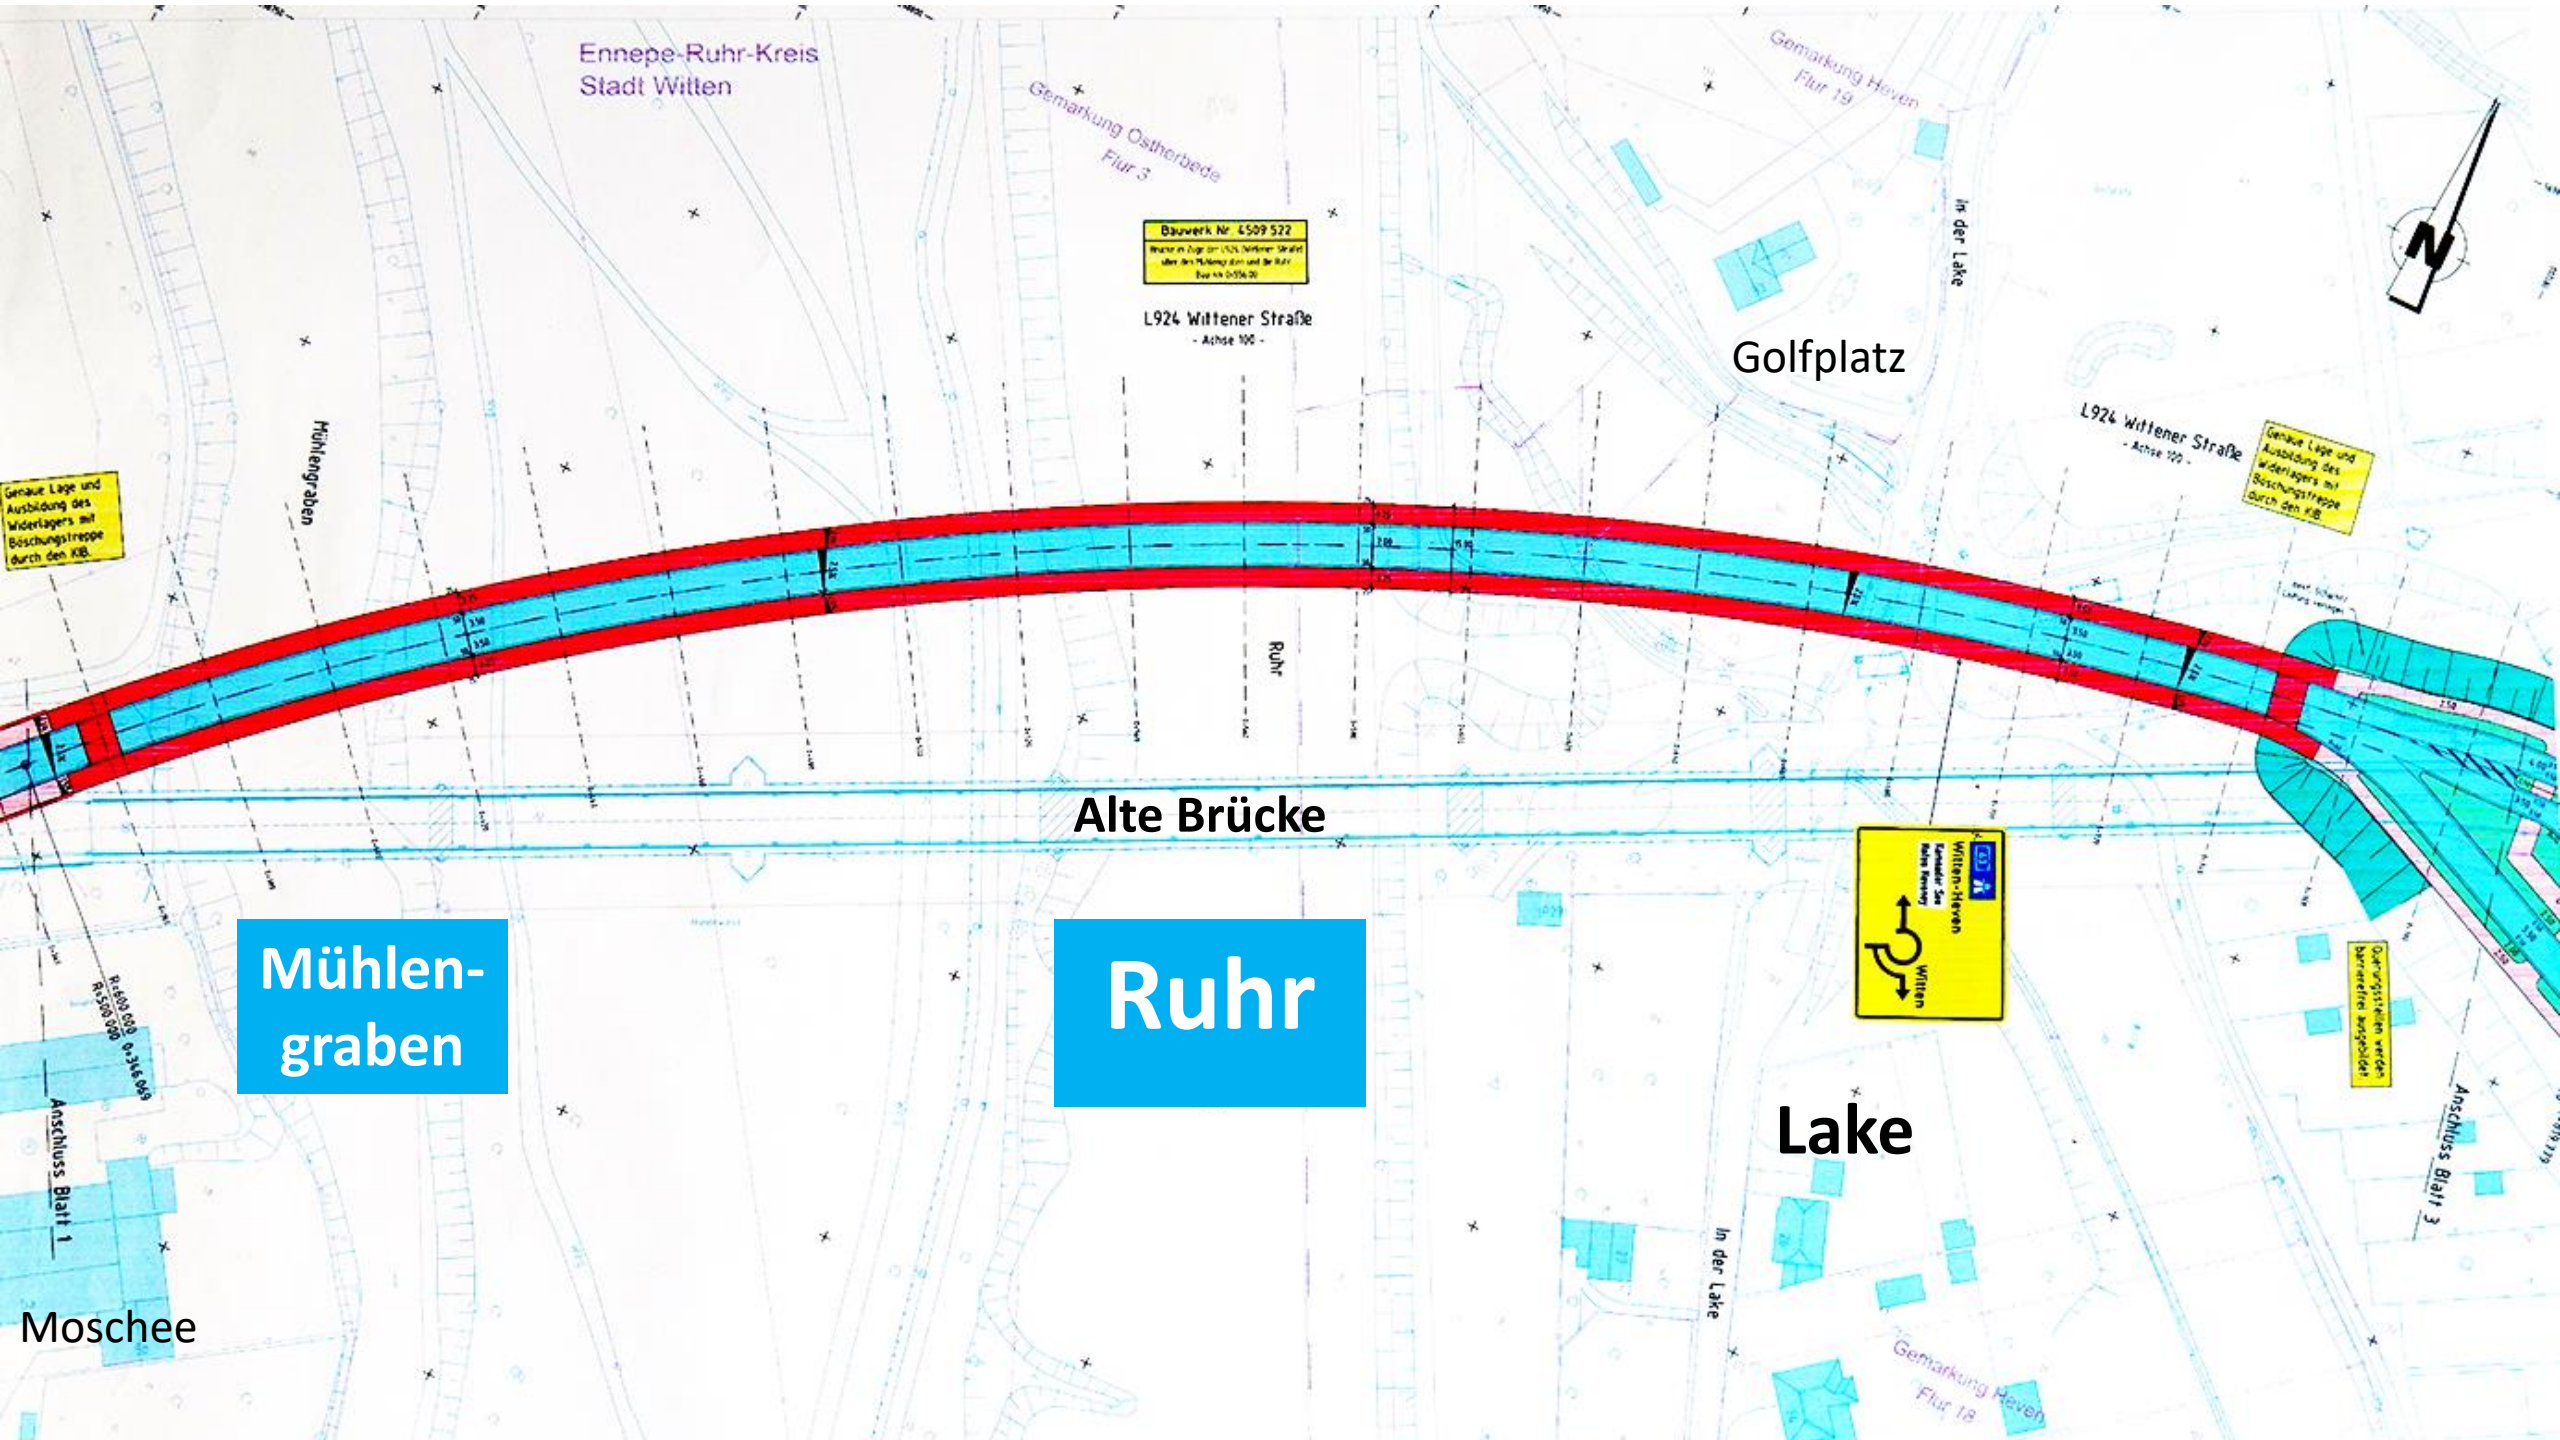
Ennepe-Ruhr-Kreis
Stadt Witten
Gemarkung Ostherbede
Flur 3
Gemarkung Heven
Flur 19
Bauwerk Nr. 4509 522
L924 Wittener Straße
- Achse 100 -
Golfplatz
In der Lake
L924 Wittener Straße
- Achse 100 -
Genaue Lage und Ausbildung des Widerlagers mit Böschungstreppe durch den KIB.
Mühlengraben
Ruhr
Alte Brücke
Mühlen-graben
Ruhr
Lake
Witten-Heven
Witten
Anschluss Blatt 1
Anschluss Blatt 3
In der Lake
Gemarkung Heven
Flur 18
Moschee

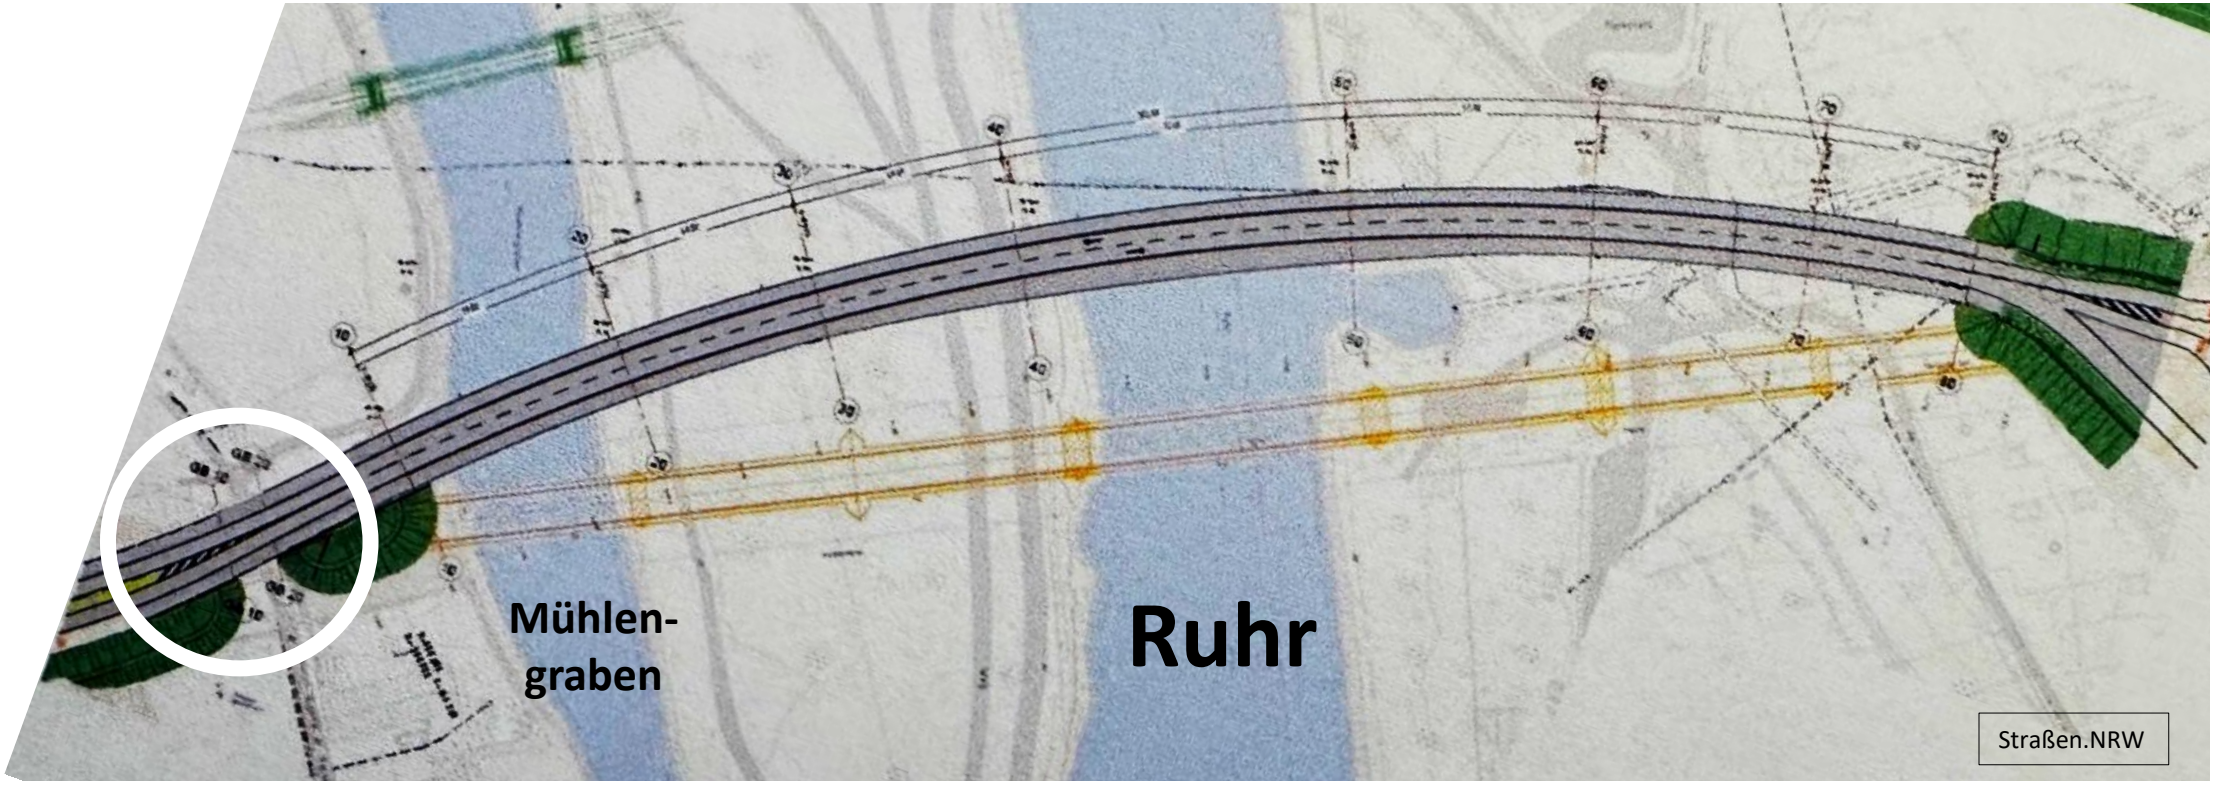

Anschluss alte Omegabrücke an neue Flussbrücken

in Höhe Gemeindebrücke/Haus Herbede

2028 (?)

Brückenabzweig

in Höhe Haus Herbede

- **Vom Rat der Stadt Witten beschlossen. Positive Machbarkeitsstudie.**
- **Viele Schritte erforderlich (B-Plan, Grundstückskauf, Bauplanung und Ausführung, Ausbau Von-Elverfeldt-Allee)**
- **Erhebliche Vorteile für die regionale Bevölkerung, Freizeitverkehre und Betriebe.**
- **Große Chance eine Brückensperrung zu verhindern.**

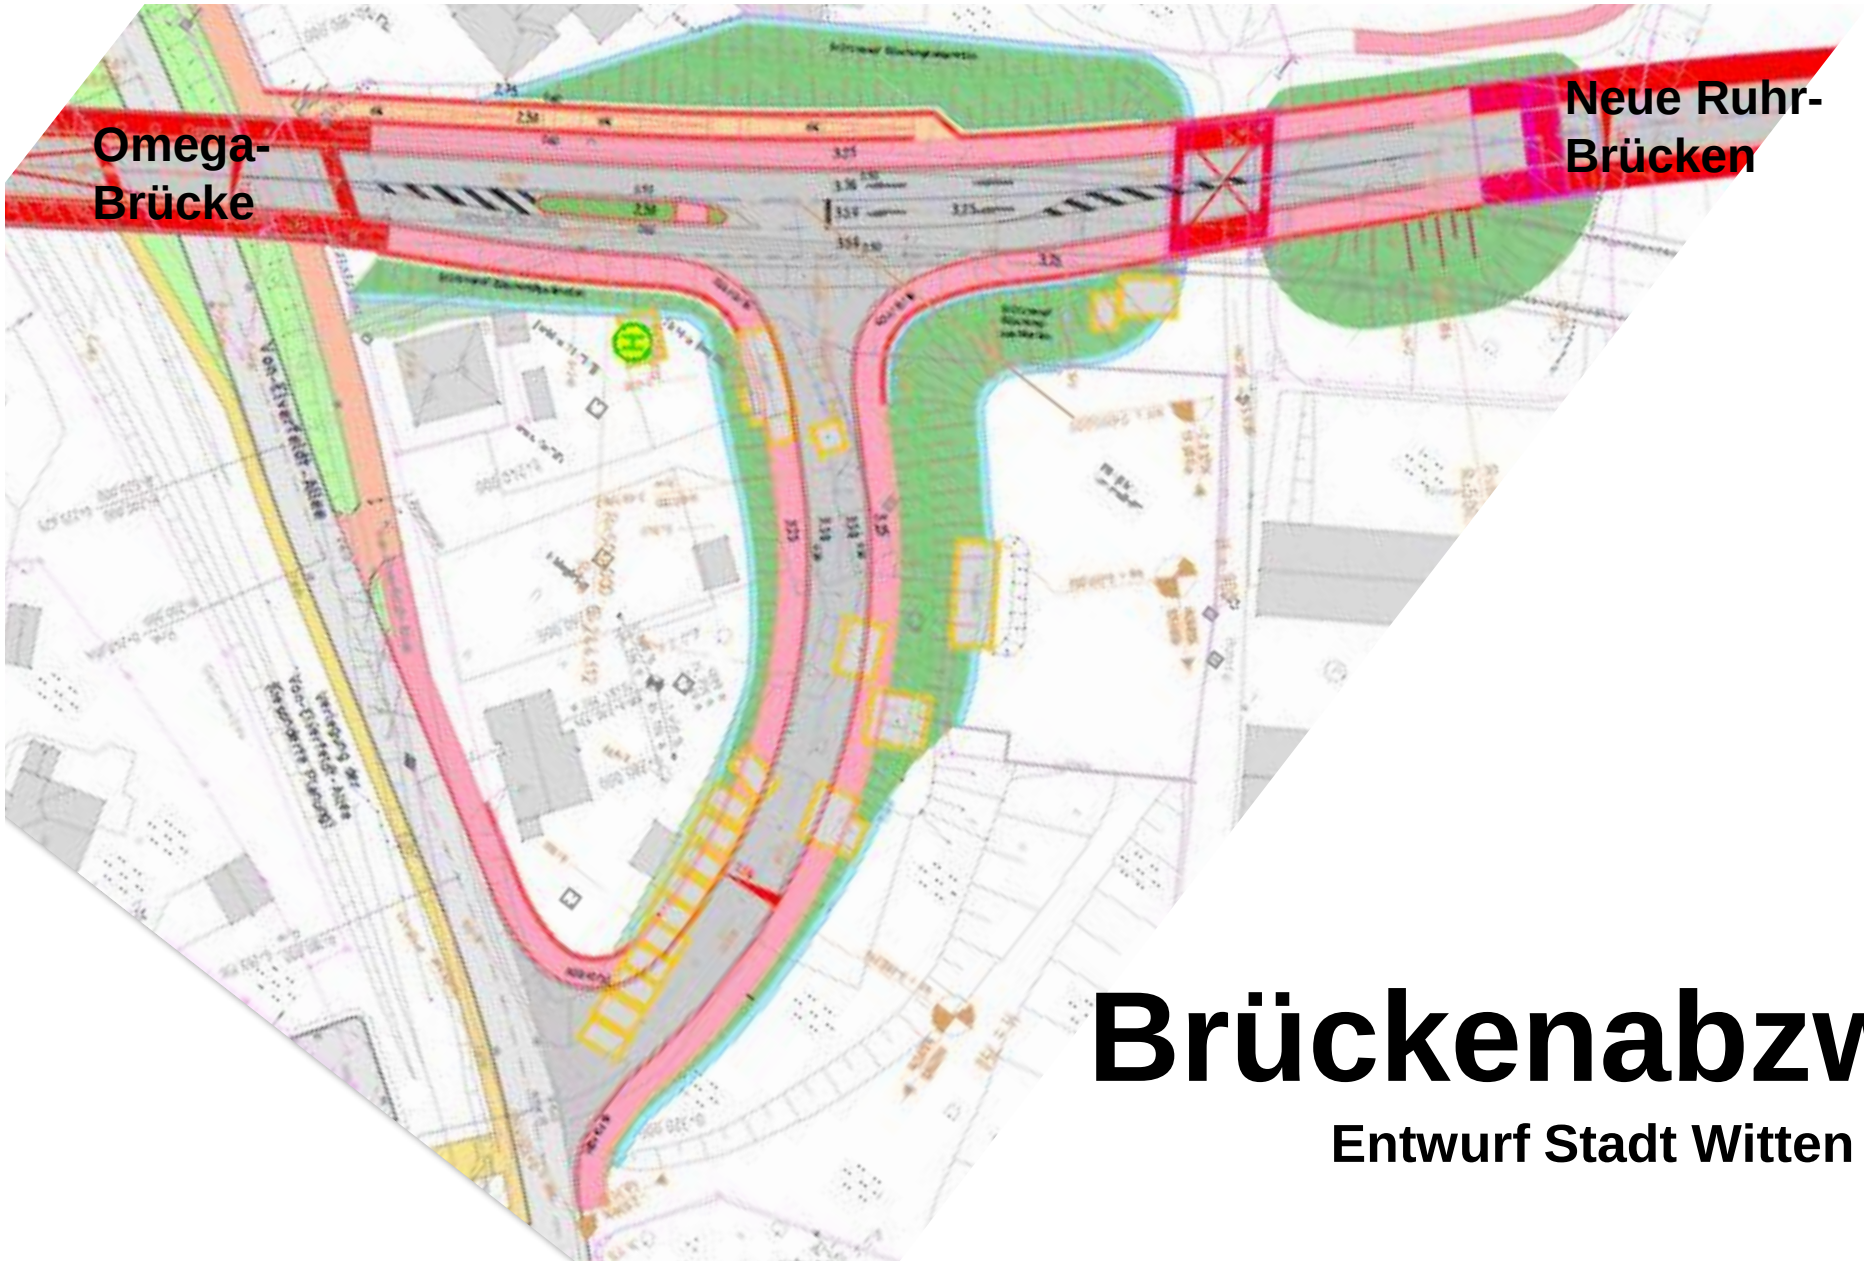

Brückenabzweig

Entwurf Stadt Witten

Universitätsstadt an der Ruhr
Witten
Stadtteil Herbede
Ennepe-Ruhr-Kreis
Brückenabzweig

Brückenabzweig
Gemeindebrücke alt

Ende
Brückenabzweig

HERBEDER VERKEHR
BESTAND

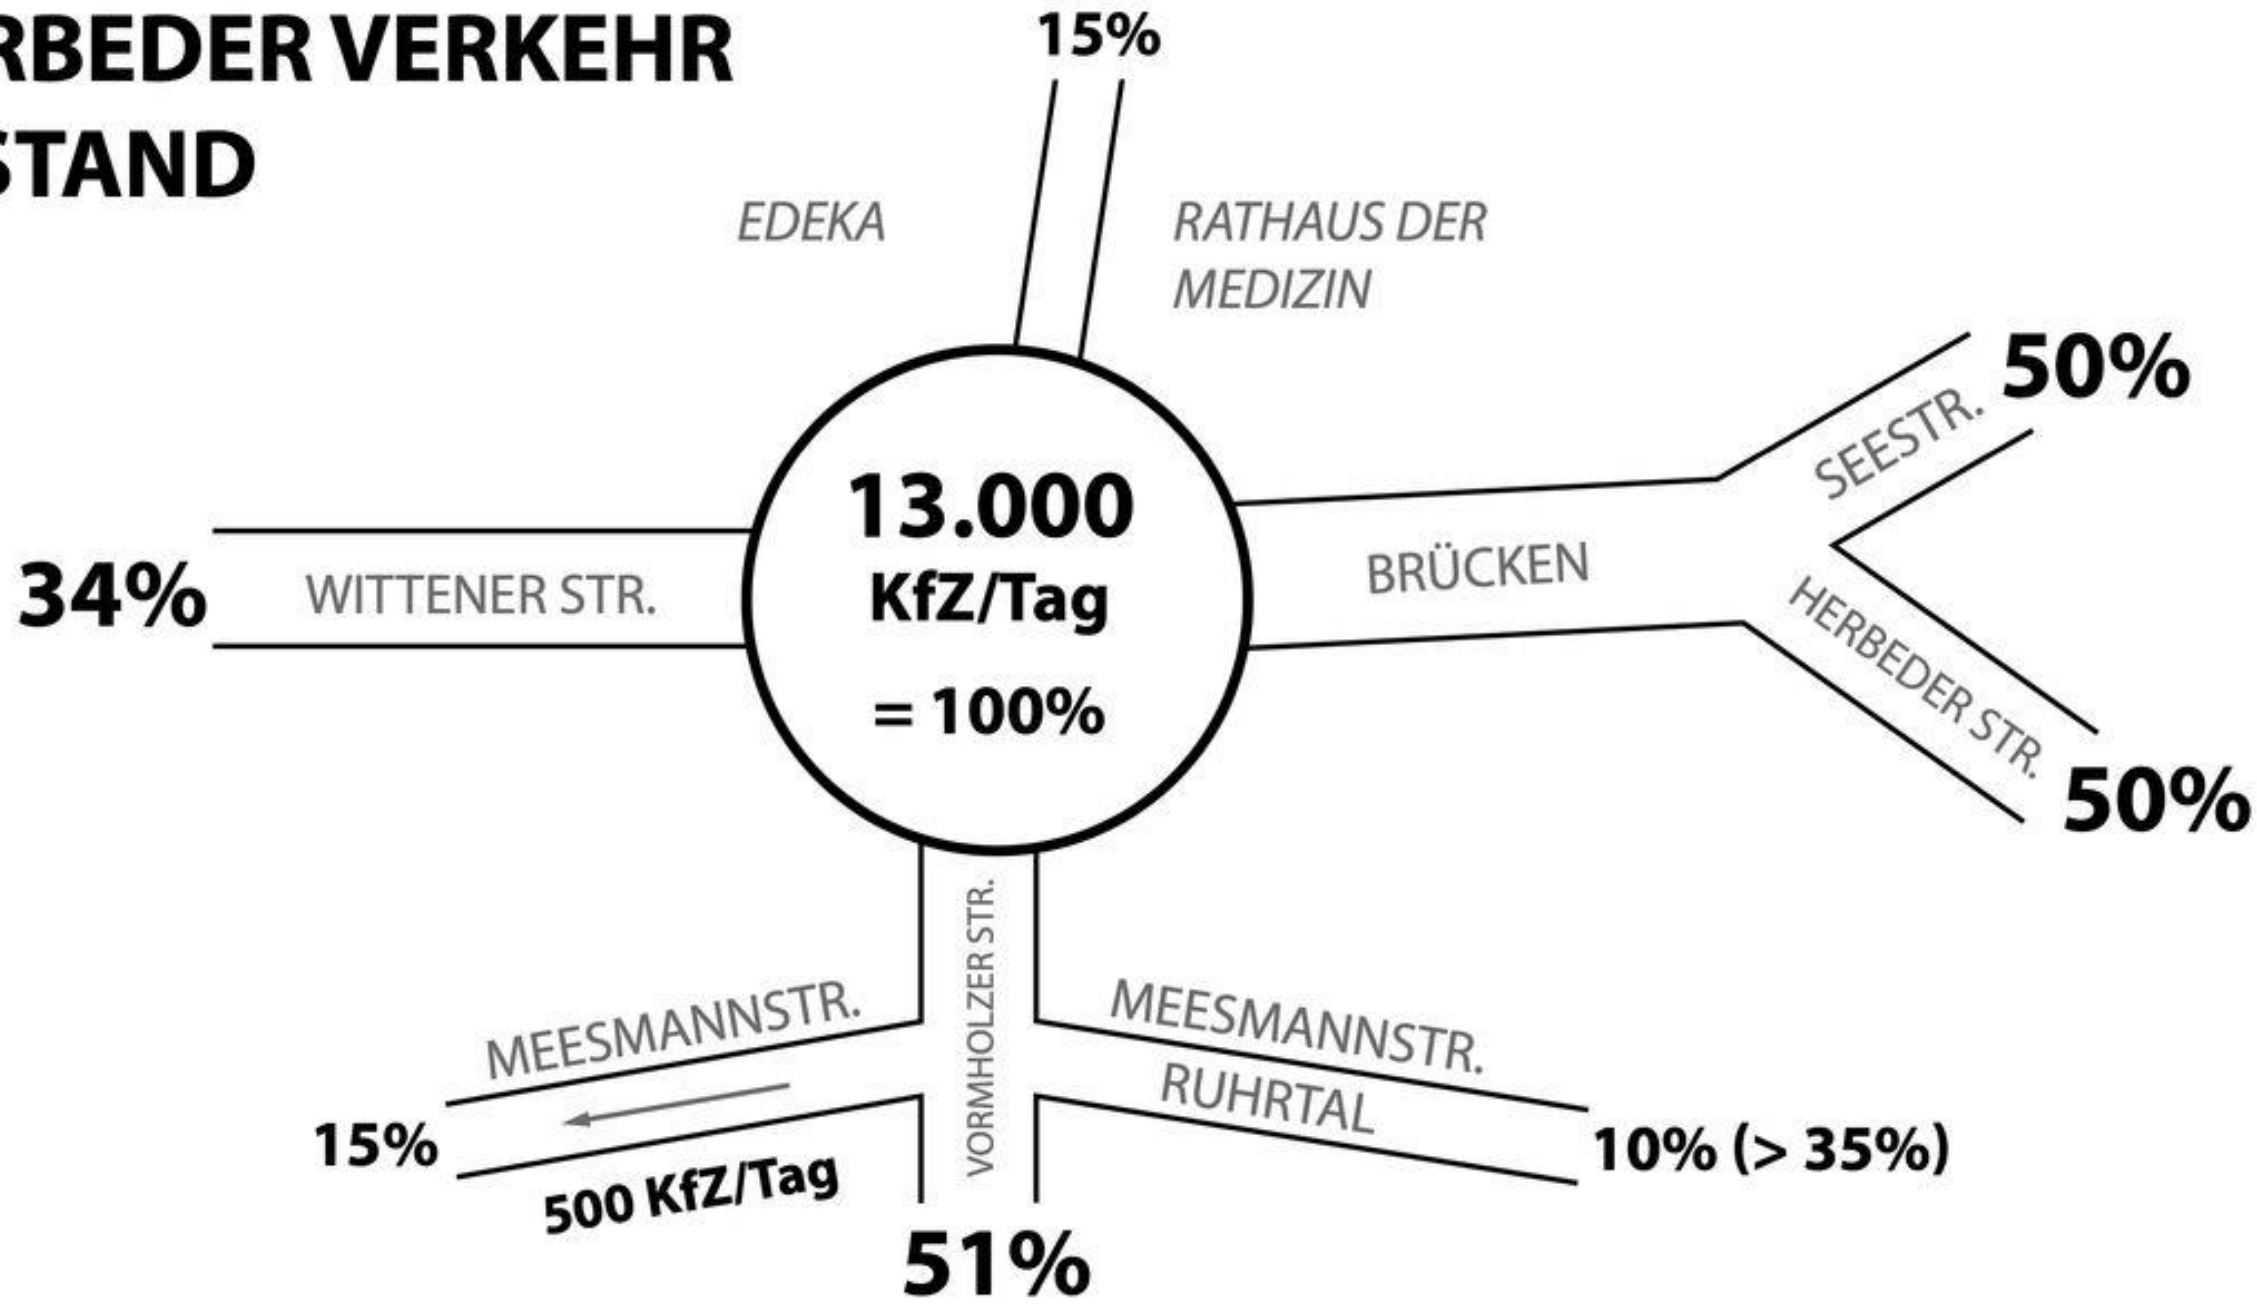

PLANUNG

STRASSEN NRW
STADT WITTEN

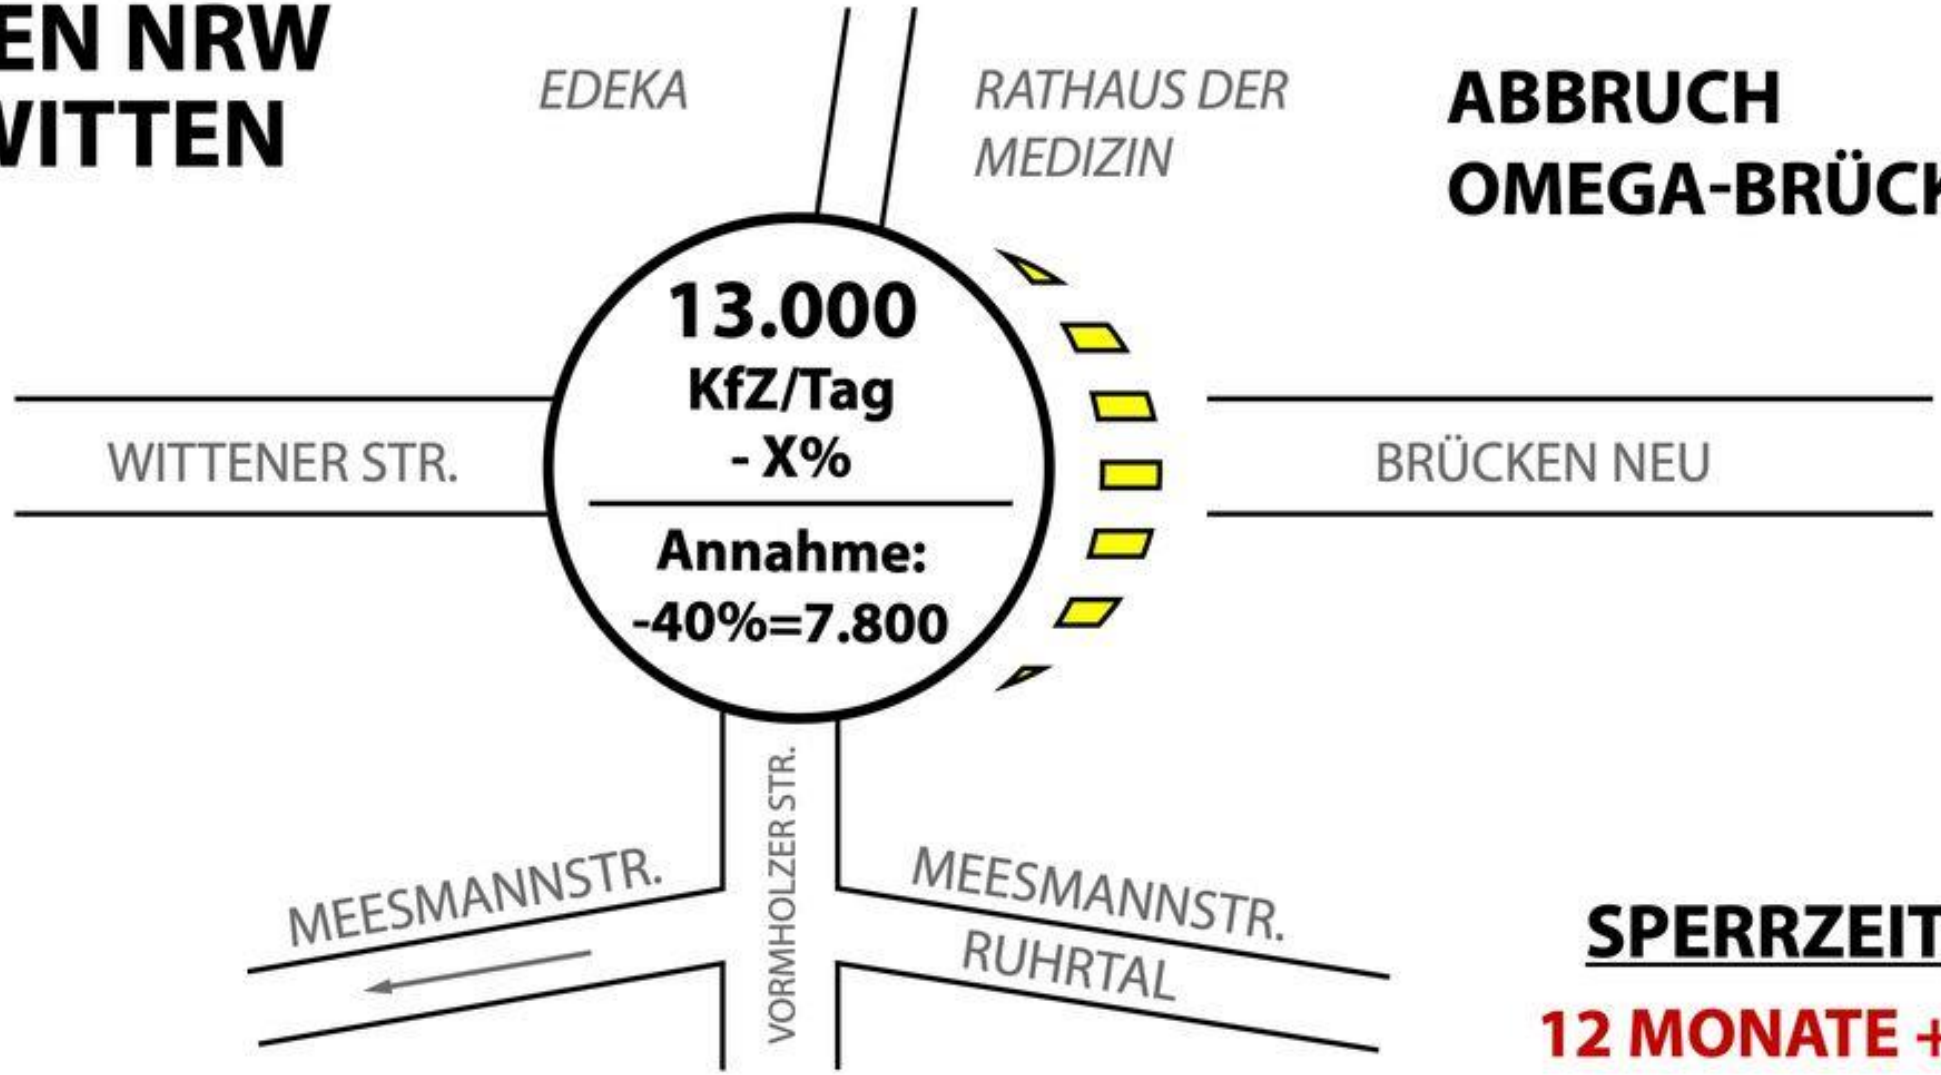

ABBRUCH
OMEGA-BRÜCKE

SPERRZEIT

12 MONATE +X

PLANUNG

AK HERBEDER BRÜCKEN

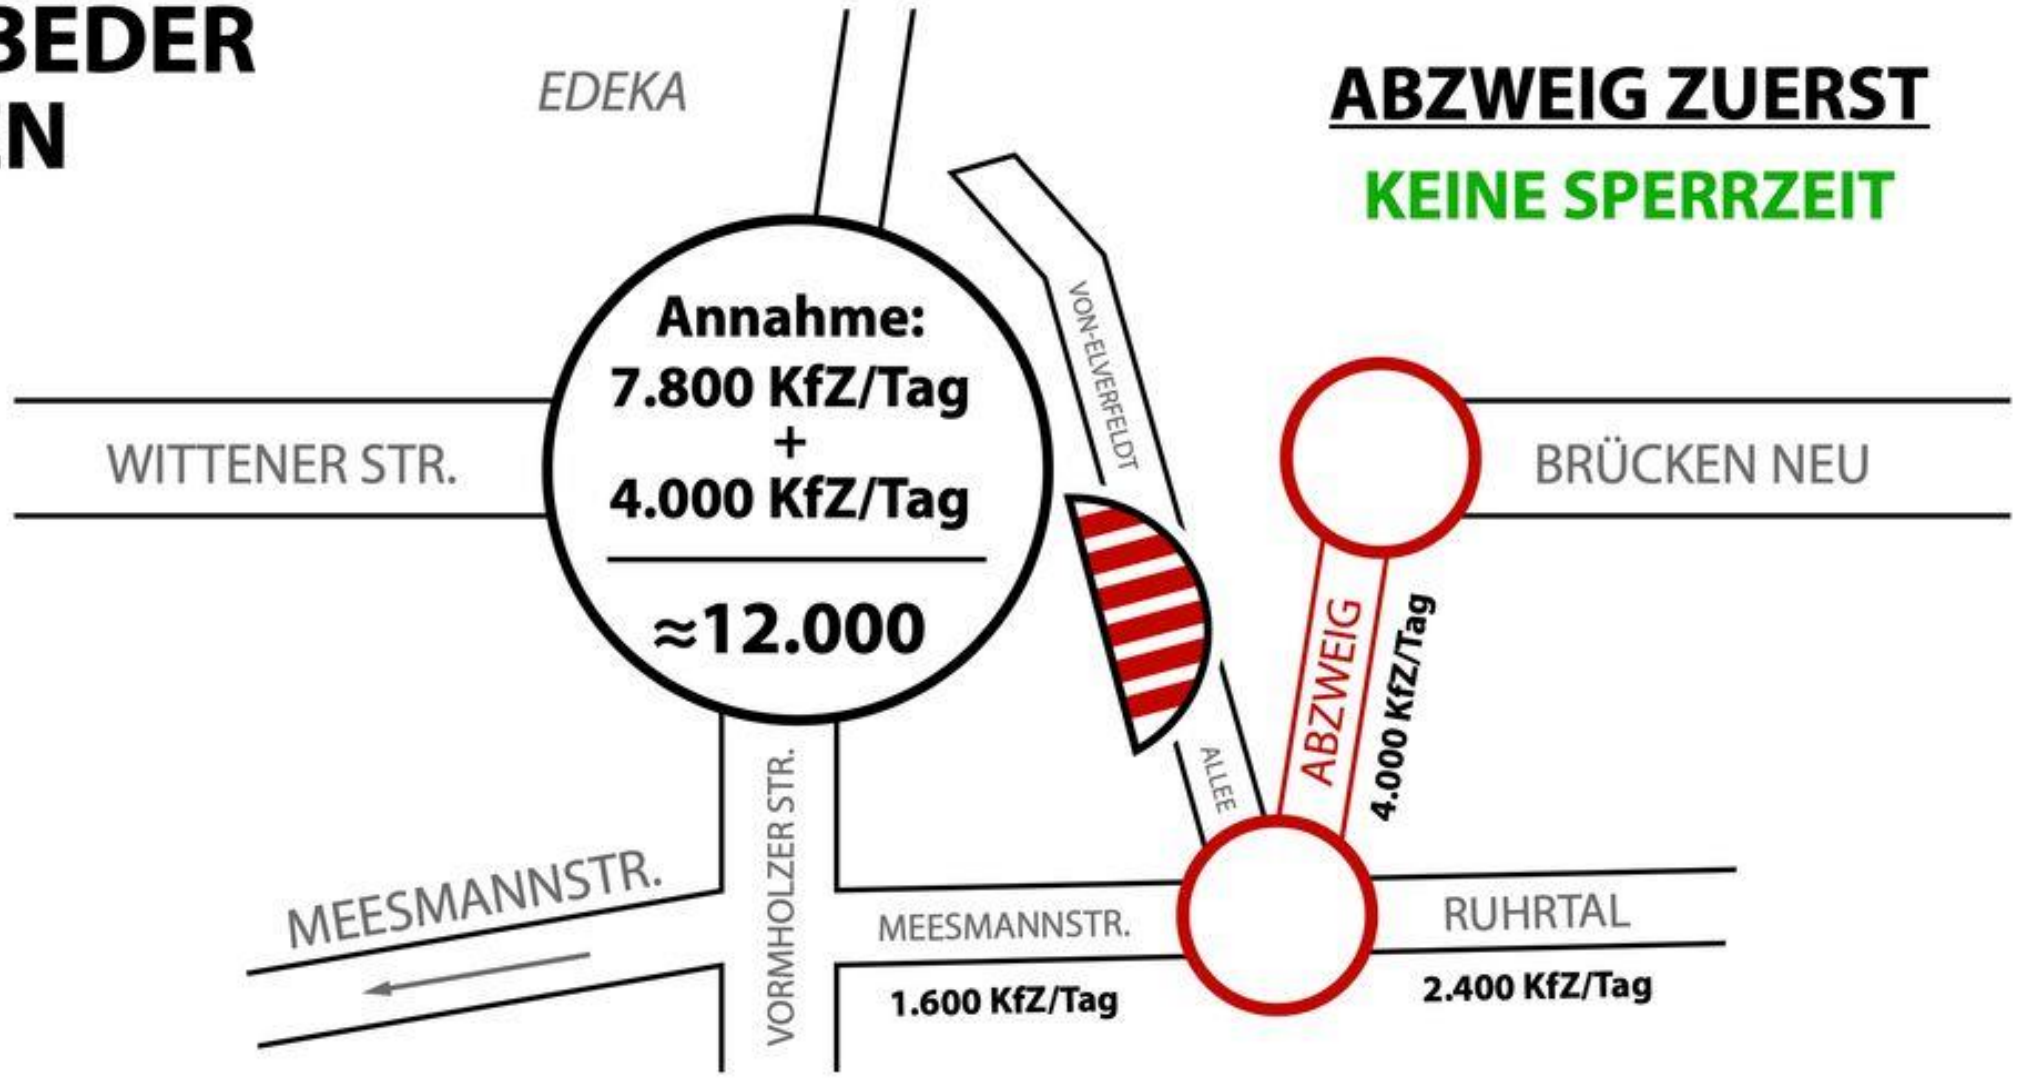

Abriss und Neubau der Lakebrücke

2028 - 2029 (?)

Neubau der Lakebrücke

(Stadt Witten)

- **Soll 6m breit werden und 18 T tragen können (Notverkehre)**
- **Veranschlagte Bauzeit 18 Monate**
- **Nach momentanem Stand kann die Brücke nicht vor der IGA 2027 fertiggestellt werden.**
- **Eventuell Abriss der Brücke während der IGA 2027 (Freizeitverkehrschaos)**
- **Voraussichtlicher Bau der Lakebrücke 2028 bis 2029**
- **Fördergelder des Landes NRW noch nicht genehmigt.**

Neubau Lakebrücke

Arbeitskreis Brückenneubau

- **Neubau sollte sich harmonisch in historisch gewachsenes Gelände einfügen. Kein Monumentalbau.**
- **Evtl. Gestaltungswettbewerb.**
- **Einbindung in sicheres Gesamtkonzept aller Verkehrswege (!)**

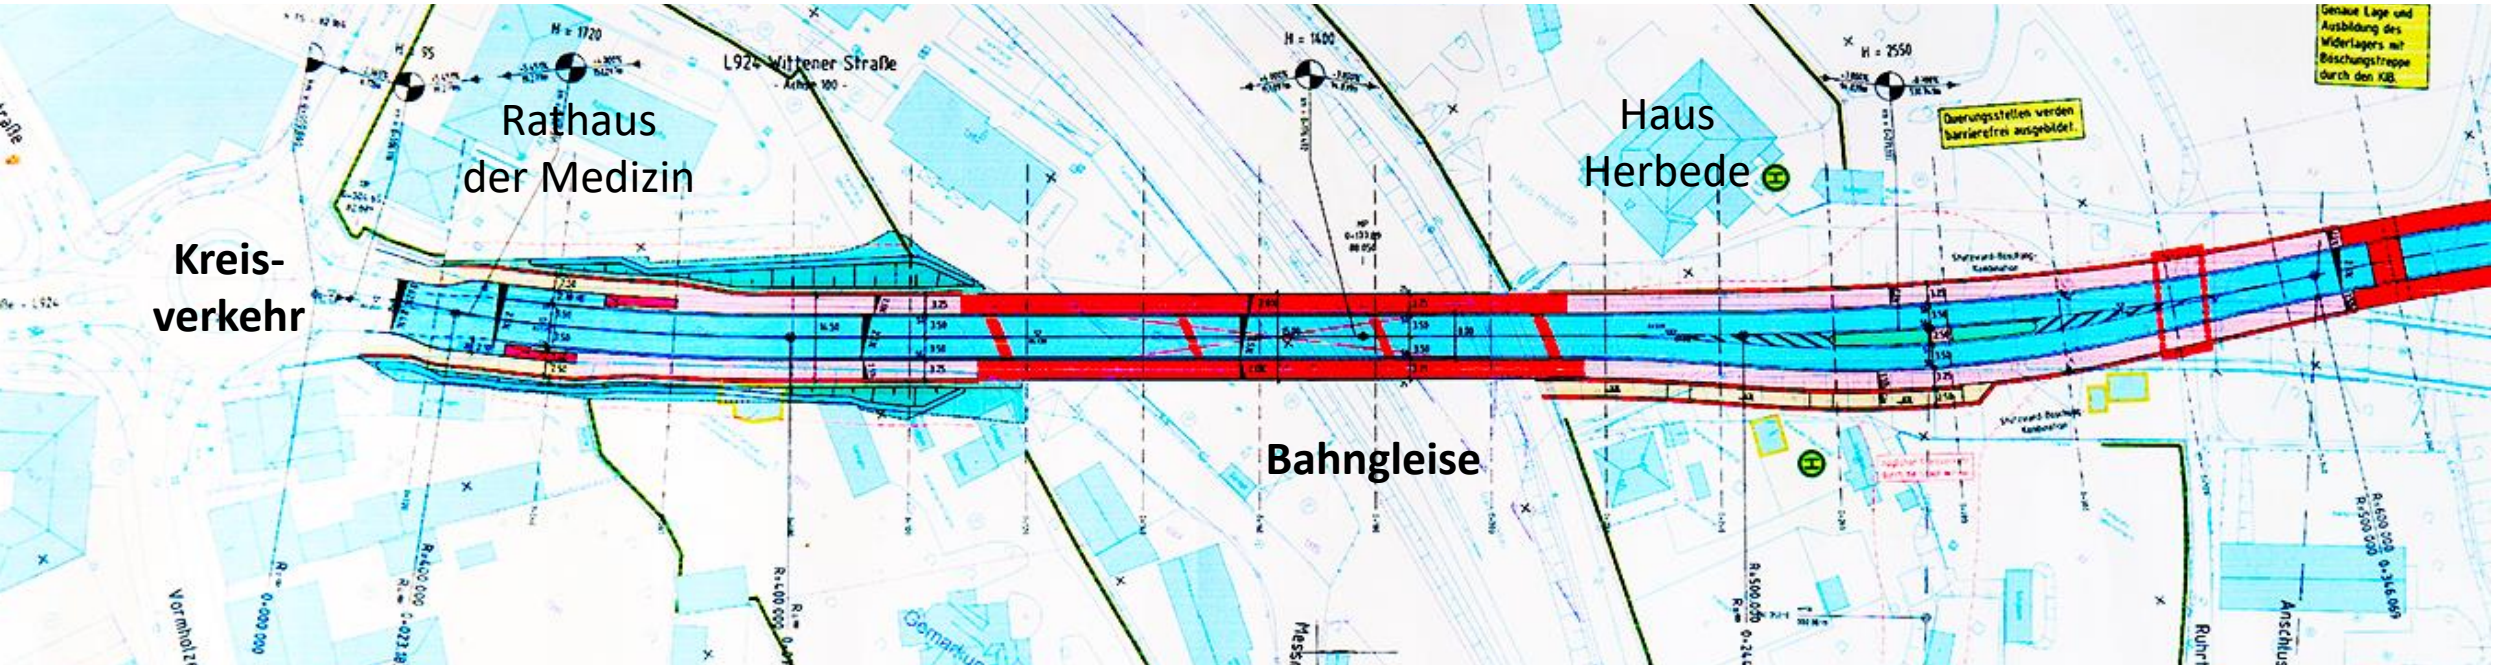

Abriss und Neubau der Omegabrücke

2030 - 2031 (?)

Stadtverwaltung

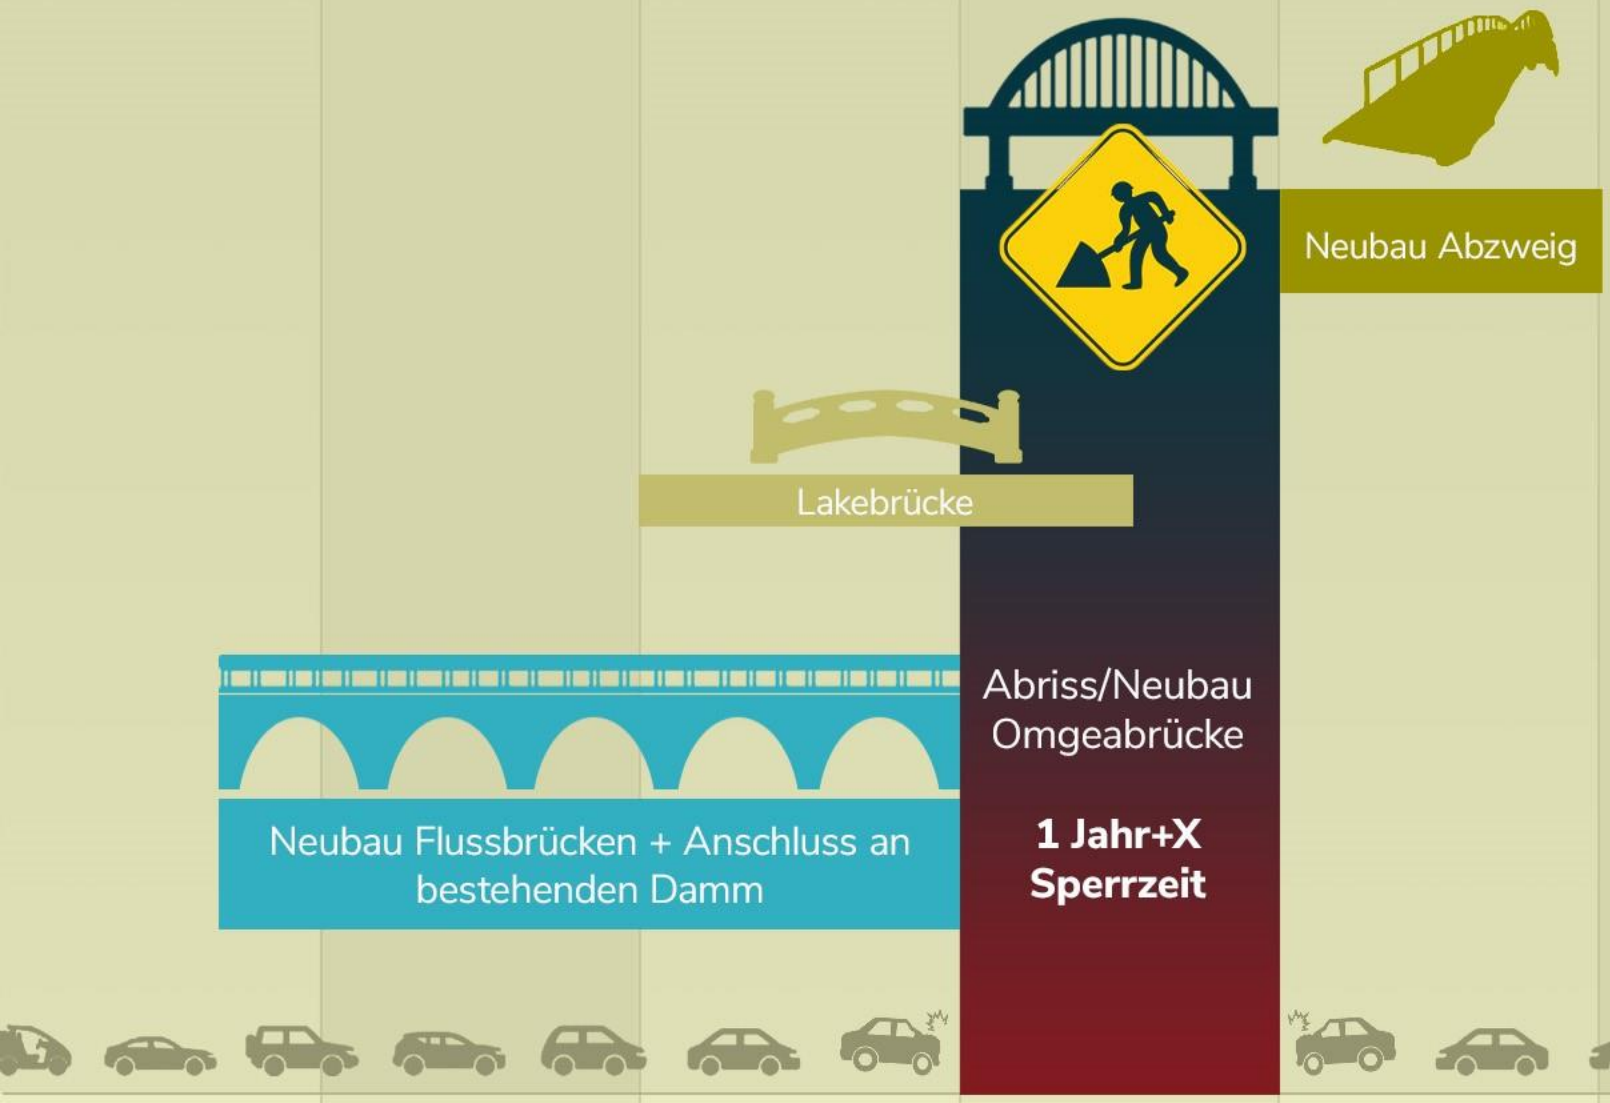

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

AK-Brücken
Variante 2

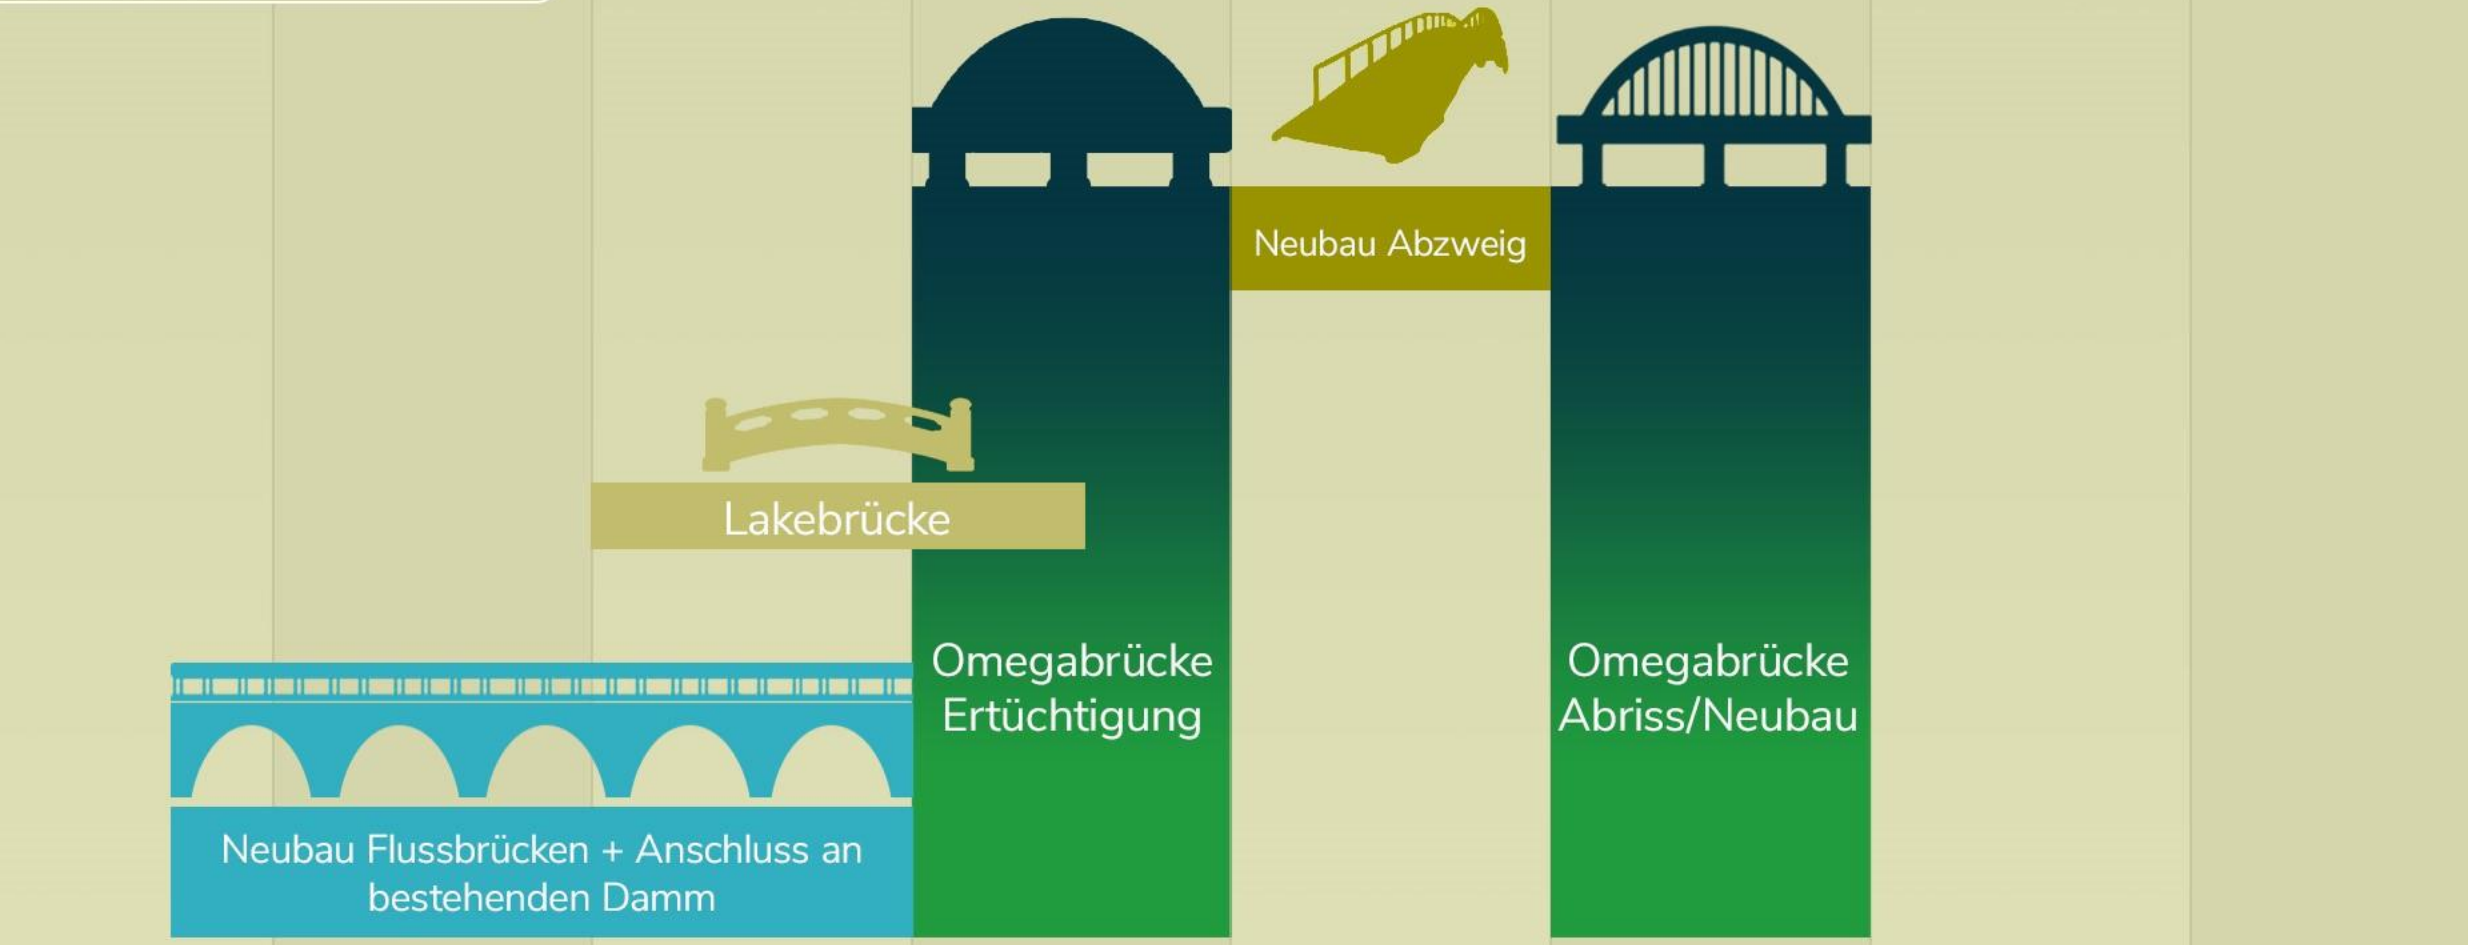

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Wie kann eine **Vollsperrung der Flussquerungen** verhindert werden?

- **Neue Flussbrücken an die alte Omegabrücke anschließen (geplant).**
- **Brückenabweig fertigstellen und an die neue Trasse anschließen.**
- **Omegabrücke erst abreißen, wenn (Teil-) Verkehre über Brückenabzweig fließen können.**
- **Standzeit der Omegabrücke durch einfache Stützungsmaßnahmen verlängern.**

Herbeder-Hevener-Brücken

Eine Vollsperrung wird nicht mehr akzeptiert (!)

- Jetzige Planung mit voraussichtlich mind. 2-jähriger Vollsperrung wird **nicht akzeptiert**.
- **Bürgerinformation** 09.10.24 im Haus Herbede.
- Start einer **Unterschriftenaktion** gegen Vollsperrung.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

AK Herbeder Brücken
